

Restaurando los hábitats de los estuarios



PROYECTO LIFE08NAT/E/000055

Restauración de hábitats de interés comunitario
en estuarios del País Vasco

Resumen de avances – 2012/1



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

INGURUMEN, LURRALDE
PLANGINTZA, NEKAZARITZA
ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA




www.euskadi.net/life_estuarios


AVANCES DEL PROYECTO ENERO-JUNIO 2012

C. ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN

| Acción | Plazo | Estado | Descripción |
|--|------------|-----------|---|
| C1. Primer tratamiento de áreas afectadas por vegetación invasora | | | De enero a marzo, se continuado con los repastos de arranque manual en Urdaibai, y en abril con los repastos con herbicida y primera actuación de las últimas superficies que quedaban en Urdaibai. |
| C2. Repaso de áreas tratadas | 30/09/2013 | Iniciadas | <p>En junio de 2012 se han iniciado los trabajos en el estuario del Lea, completándose toda la superficie afectada durante este mes.</p> <p>Por el momento, se han ejecutado las siguientes superficies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repaso (arranque manual): 30,36 ha - Repaso (aplicación de herbicida): 39,83 hectáreas - Primera actuación (aplicación de herbicida): 15,43 hectáreas <p>Además, se han incluido más superficies no previstas en un inicio en el estuario del Lea, tal como se puede observar en el plano adjunto.</p> <p>Por otra parte, se están realizando las gestiones oportunas para poder ampliar los trabajos de eliminación de <i>Baccharis halimifolia</i> en Txingudi, ya que se han inventariado más superficies afectadas en este estuario.</p> |
| C3. Revegetación de áreas tratadas | 31/05/2013 | Iniciada | Se ha comenzado con la planificación de la plantación a realizar en el invierno de 2013. Para ello se ha realizado una visita de reconocimiento a las Islas del Bidasoa, primera zona en la que se va a realizar la plantación. |



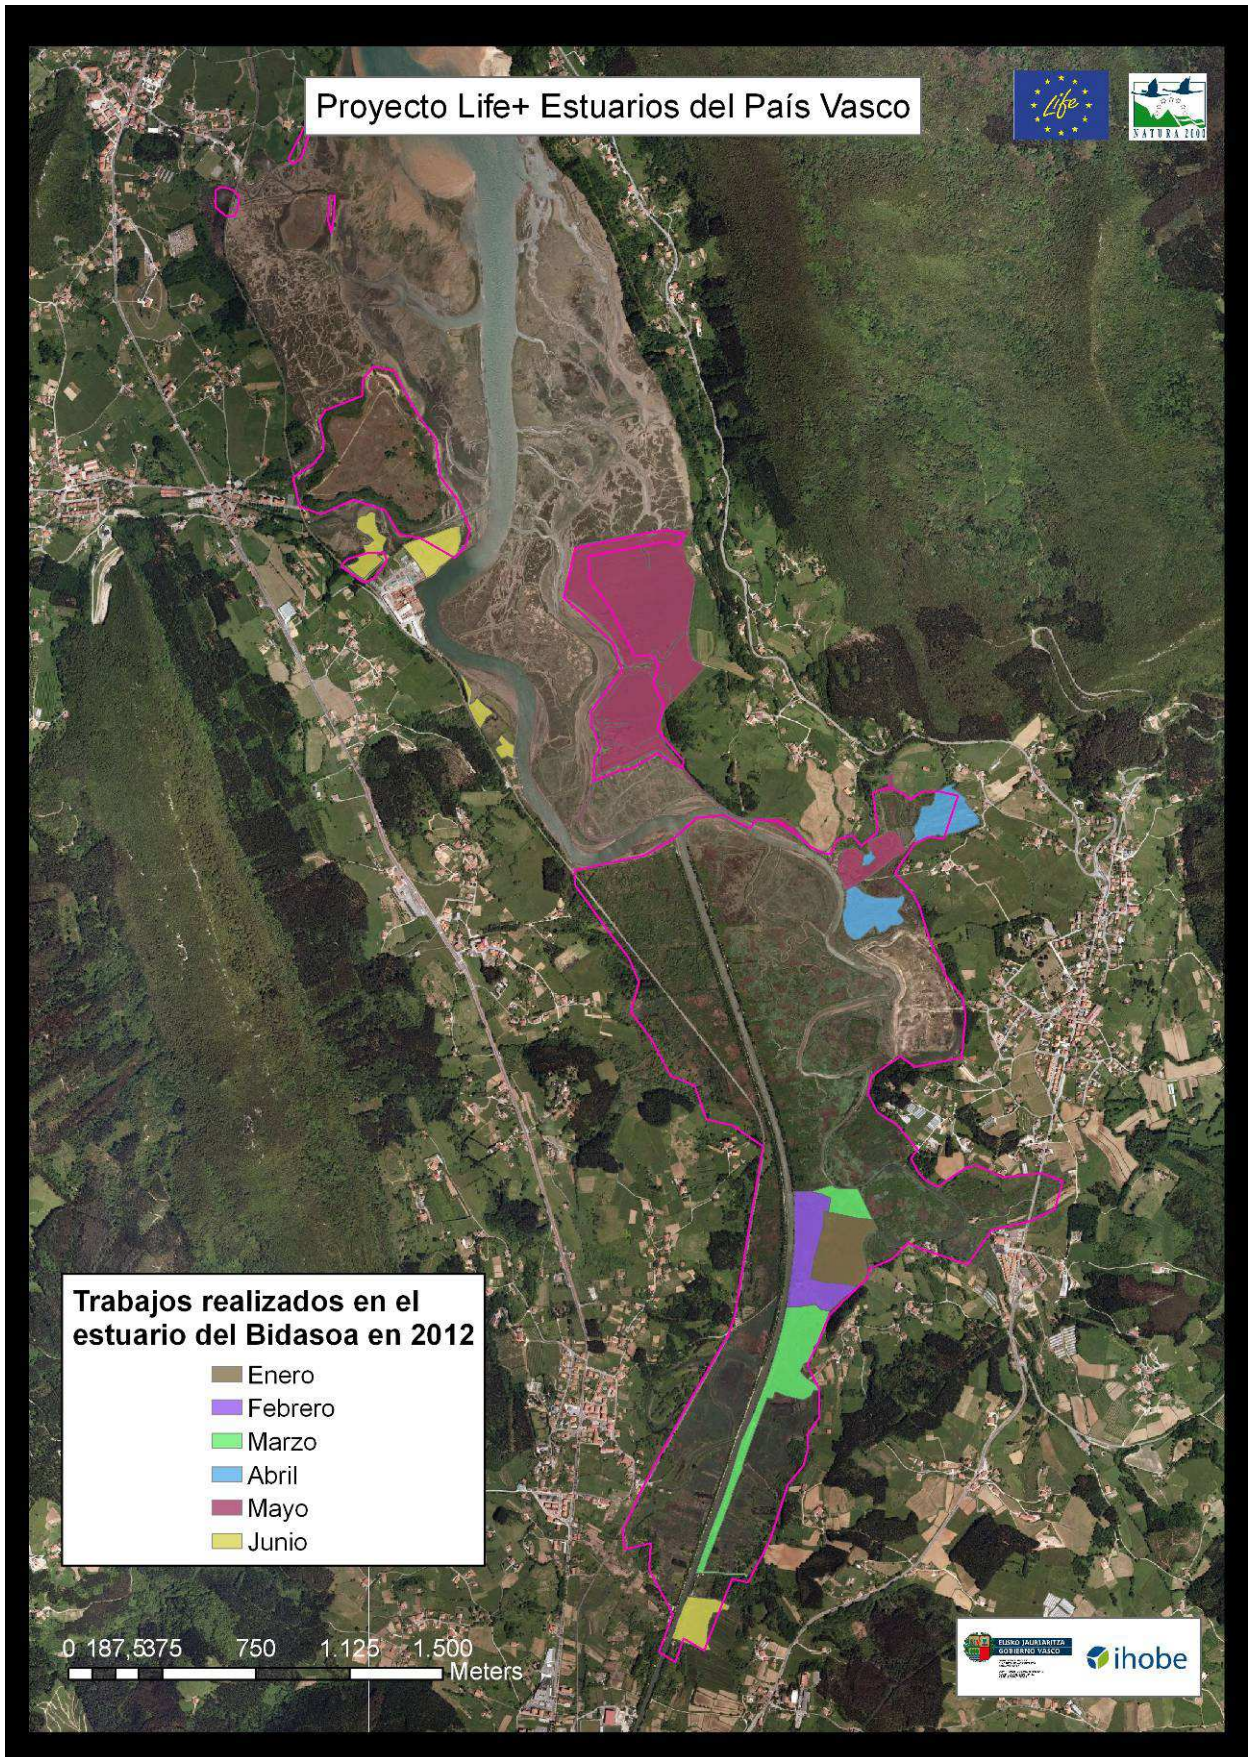

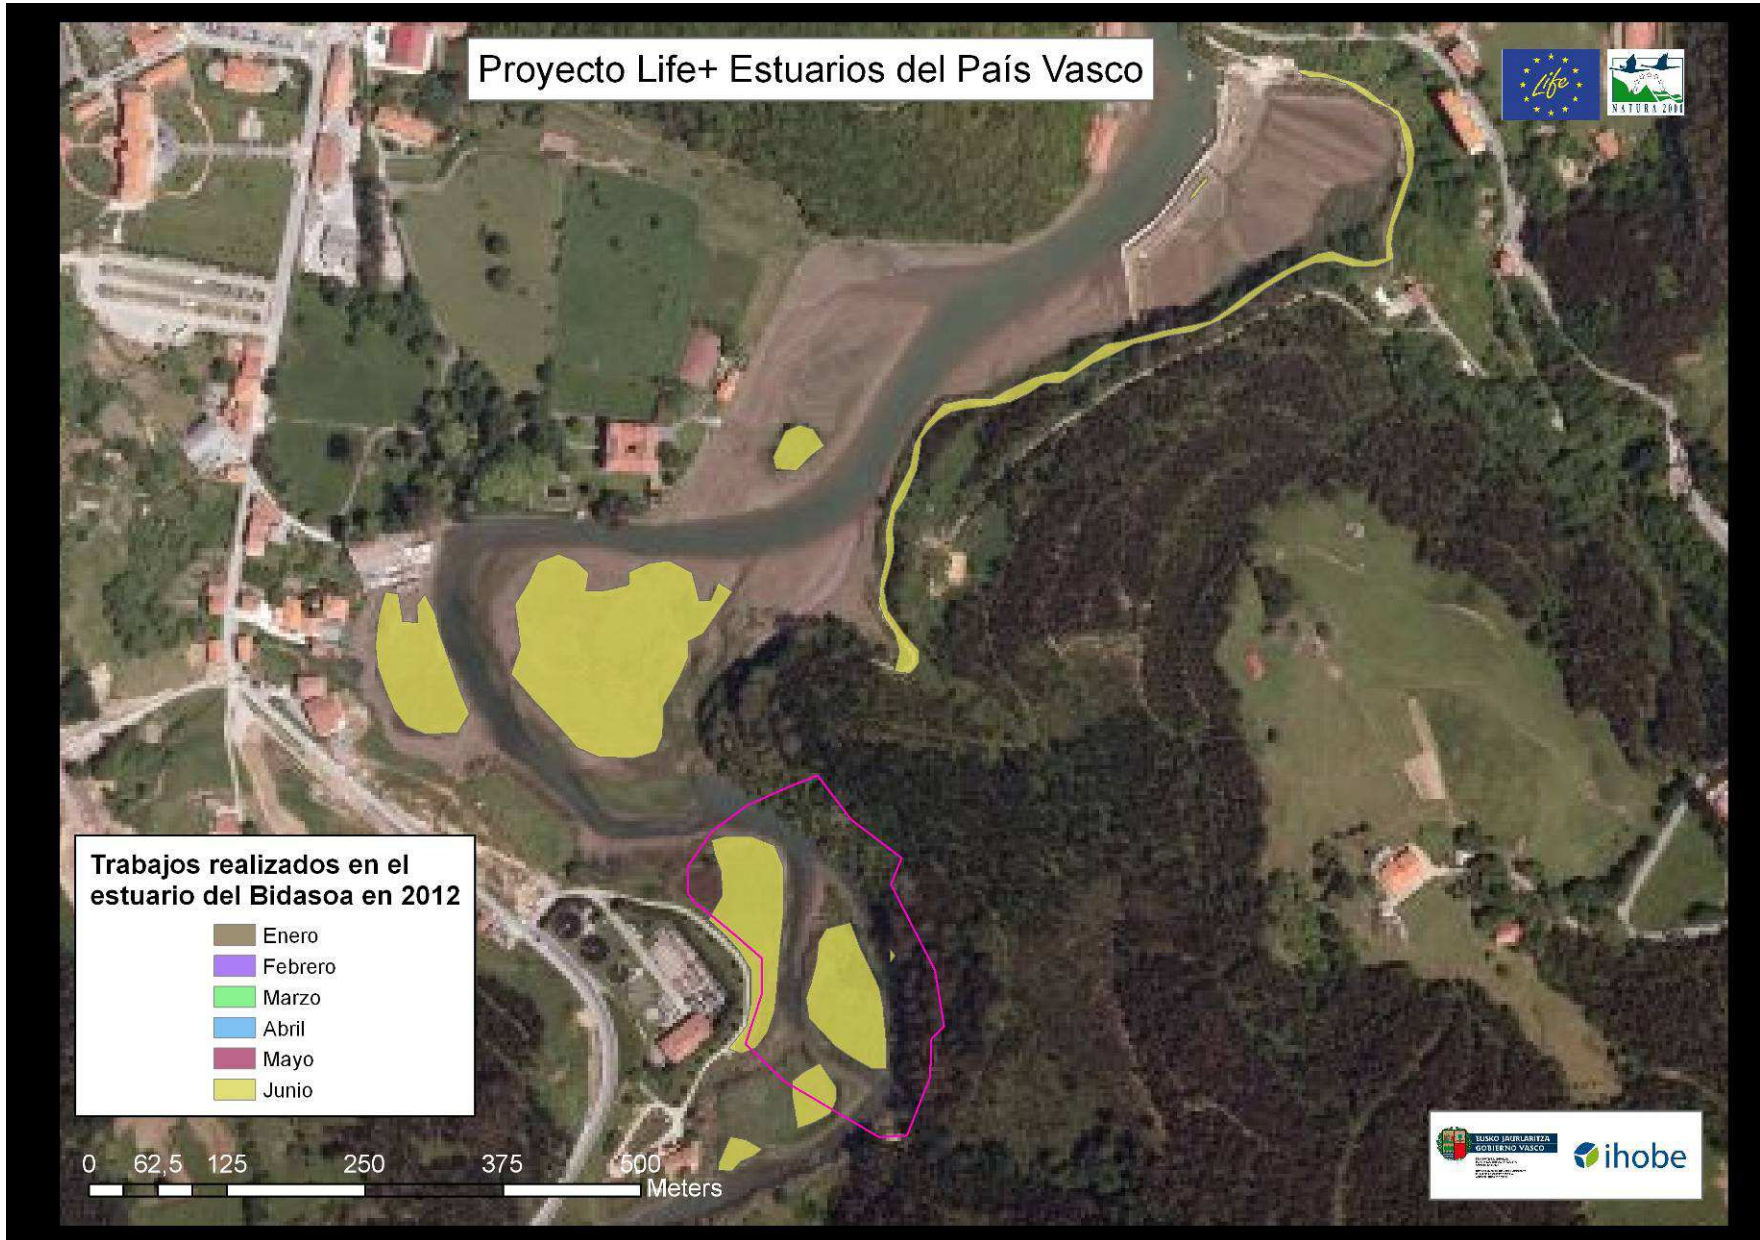

D. INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

| Acción | Plazo | Estado | Descripción |
|--|------------|-------------|--|
| D1. Paneles de información del proyecto (fijos y móviles) | 31/03/2010 | Iniciada | El panel de Txingudi ha sido reparado ya que había sufrido desperfectos debido a vandalismo. |
| D2. Difusión del proyecto en página web | 31/06/2010 | Iniciada | Se han incluido los informes de seguimiento de resultados, estudio de toxicidad del glifosato, fotografías seleccionadas en el concurso, y otros documentos de interés. |
| D3. Informe layman del proyecto | 31/12/2013 | No iniciada | Previsto para 2013 |
| D4. Comisión internacional de seguimiento y difusión de experiencias | 30/06/2011 | Iniciada | Se ha distribuido el documento de conclusiones de la Comisión Internacional entre los participantes. |
| | 30/06/2013 | | |
| D5. Jornada técnica especies invasoras en la Red Natura 2000 | 31/10/2011 | Finalizada | |
| D6. Campaña de divulgación y educación ambiental "Restaurando los hábitats de los estuarios" | 31/05/2010 | Iniciada | Folleto divulgativo Se están distribuyendo los 10.000 ejemplares del folleto a través del Centro de Biodiversidad de Euskadi |
| | 2012 | Finalizada | Concurso de fotografía En abril se lanzó la convocatoria para el concurso de fotografía, titulado "Estuarios: amenazas y conservación", haciendo la difusión a través de la página web, sociedades y agrupaciones fotográficas de la CAPV y nota de prensa a medios de comunicación. Se recibieron más de 70 fotografías de 23 autores y se seleccionaron 24 fotografías para ser expuestas en una exposición itinerante. Además, se otorgaron dos premios a las dos mejores fotos. La inauguración de la exposición se realizó el 20 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Biodiversidad y la celebración del 20 Aniversario del programa Life en Txingudi Ekoetxea |

| | | | |
|--|-------------|----------|--|
| | | | <p>(Plaiaudi, Irun). A la jornada acudieron la Viceconsejera de Medio Ambiente, el Director de Biodiversidad, la Jefa de Servicio de Biodiversidad del Gobierno Vasco y la Jefa de Jefa del Área Internacional de la Dirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.</p> <p>La exposición va a ser trasladada a las áreas de proyecto de Lea y Txingudi en los próximos meses.</p> |
| | 2012 y 2013 | Iniciada | <p>Visitas didácticas</p> <p>Finalizado el programa escolar 2011-2012, en total ha habido una participación de 50 alumnos en la unidad didáctica específica sobre <i>Baccharis halimifolia</i>.</p> <p>En mayo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, se han organizado diversas actividades dirigidas al público infantil y juvenil relacionadas con el proyecto Life, como una gymcana, un concurso de fotografía, etc. Sin embargo, debido al mal pronóstico del tiempo para la fecha de celebración, no ha habido asistentes en las actividades organizadas.</p> |
| | 2010 | Iniciada | <p>Divulgación en medios de comunicación</p> <p>Se han remitido dos notas de prensa (celebración del Día de la Biodiversidad y concurso de fotografía; inicio de los trabajos en Lea)</p> <p>Se han publicado artículos en las revistas de Foresta (Colegio Oficial de Ingenieros Forestales) y Txingudiko Paduren Albistegia (Gobierno Vasco).</p> <p>El proyecto ha sido presentado en los siguientes congresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jornadas EEI ríos y humedales (Valencia, enero 2012) - Congreso EUROPARC (Barcelona, marzo 2012) - Congreso ESPARC (Murcia, mayo 2012) |



| | | | |
|--|--------------------|-------------------|---|
| | <p>No prevista</p> | <p>Finalizada</p> | <p>La exposición "<i>Baccharis halimifolia</i>, historia de una invasión" instalada en el Centro de Biodiversiad de Euskadi está teniendo una buena aceptación.</p> |
|--|--------------------|-------------------|---|



E. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO

| Acción | Plazo | Estado | Descripción |
|--|------------------------------|-------------|--|
| E1. Gestión del proyecto por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco | 31/01/2010 | Iniciada | Seguimiento continuo del proyecto por parte del Comité de Pilotaje y contacto con equipo externo de seguimiento del Programa LIFE. 3 reuniones de seguimiento celebradas durante el primer semestre. |
| | 30/09/2010 | Iniciada | Informe intermedio redactado y remitido a la Comisión Europea en Enero de 2012 |
| E2. Seguimiento de resultados del proyecto | 31/12/2010 | Iniciada | Reunión de planificación del seguimiento celebrada en marzo, donde se incluyen mejoras y se prevén más puntos de muestreo en las tres zonas. Los trabajos de campo se iniciarán a partir de septiembre. |
| E3. Auditoría | 31/03/2014 | No iniciada | Previsto elaborar al final del proyecto |
| E4. Plan de Conservación posterior a LIFE | | No iniciada | Previsto elaborar durante 2013 |
| E5. Medidas de seguimiento e investigación sobre la aplicación del glifosato | Antes de inicio de C1 y C2 | Finalizada | Plan de Contingencia elaborado y en aplicación durante los trabajos de eliminación de vegetación invasora. |
| | Antes de inicio de C1 y C2 | Finalizada | Plan de Seguridad y Salud de empresa adjudicataria elaborado en septiembre 2010 y en aplicación durante los trabajos de eliminación de vegetación invasora. |
| | Durante periodo del proyecto | Finalizada | Finalización del estudio e informe sobre la toxicidad del glifosato y la mezcla utilizada en el proyecto Life por el equipo de investigación de la UPV/EHU. (Descargar informe final) |



| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|---|
| | <p>Durante periodo del proyecto</p> | <p>Iniciada</p> | <p>Análisis continuado de datos de la Red de Seguimiento del Estado Ecológico de las aguas de transición y costeras del Gobierno Vasco.</p> <p>Se prevé remitir el informe de la campaña 2011 junto con el Informe de progreso.</p> |
|--|-------------------------------------|-----------------|---|

